

第四水厂扩建工程

简报

第三 塘桥

污水厂扩建及一期提标改造

第二十九期

2020.02.25

要闻传递

12月30日，工程筹建组召开工作总结会。公司总经理卢东亮参加。会议由公司副总经理、筹建组组长王少华主持，对筹建组2019年主要工程的工作情况作出总结，并明确了工程筹建组2020年的工作目标。



1月8日，副市长徐平观一行来第四水厂扩建工程工地现场检查工程进度，图为视察纳滤膜车间设备安装情况。他强调，第四水厂深度处理工程施工刻不容缓，要求筹建组再接再厉，全力确保工程按期竣工。




12月31日，市水务局副局长翟二生一行来第四水厂扩建工程工地现场检查工程进度等。

1月19日，苏州市水务局副局长陈习庆一行来第三污水处理厂扩建工程工地现场检查节前安全工作等。



2月3日，市住建局局长蒋新峰、市水务局副局长翟二生分别来第四水厂扩建工程工地现场检查疫情防控工作，并带来了防疫物资。

2月4日，市应急管理局副局长徐志斌带队共四人对第四水厂及扩建工程工地现场检查疫情防控及安全工作等。

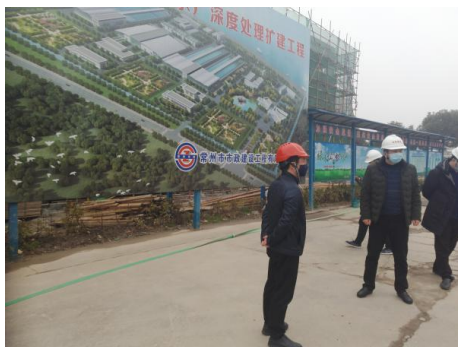

2月13日，市水务集团有限公司副总经理刘峰一行来第四水厂扩建工程检查疫情防控期间的安全生产情况。

落实疫情防控 保障工程推进

面对突发新型冠状病毒感染肺炎疫情的严峻形势，工程筹建组严格按照公司防控疫情要求，全面落实公司关于疫情防控的工作部署。全体员工 24 小时保持通讯畅通状态，配合村、社区及公司做好调查摸底登记上报工作，每日对在岗员工测体温、对办公区域及公车进行消毒，并做好相关台账记录。



为保障工程进度，全面加强施工现场疫情防控，要求施工单位管理人员率先进场，按规定办理复工手续、签署复工备案表；管理人员满足隔离要求后按照疫情防控部署陆续进场施工工人，每位返苏的工人信息必须登记造册，如实申领“苏城码”、并签署“个人健康状况登记

承诺书”；所有进入工地的人员必须先向总包单位报备，未报备的人员一律不得进入工地；每日对工程现场办公区域进行消杀、并记录好防疫工作台账。

疫情期间工程施工安全刻不容缓，我们将狠抓责任落实、强化具体措施、明确应急方案、细化工作流程，确保工程稳步推进。

年前及二月份工作完成

一、第四水厂扩建工程：

- 1、综合加药间、超滤膜车间、纳滤膜车间等单体装饰工程正在施工；
- 2、钢结构、幕墙正在施工；
- 3、沉淀池吸泥机正在安装；
- 4、纳滤膜车间膜架、管道等正在安装；
- 5、浓缩池、平衡池试水中；
- 6、电气设备基础槽钢、室内电缆沟支架、接地等正在安装；
- 7、阀门井及流量计井正在浇筑，蝶阀正在安装；
- 8、厂区生产管线、雨水管正在敷设；
- 9、室外电缆沟、加药管沟正在浇筑。

二、第三污水处理厂扩建及一期提标改造：

生化池壁板钢筋正在绑扎。

三、塘桥片区污水处理厂扩建及一期提标改造：

- 1、消毒池土方回填完成；
- 2、1#塔吊拆除完成；
- 3、生化池底板浇筑，壁板钢筋绑扎。

三月份工作计划

一、第四水厂扩建工程

- 1、二级泵房、变电所、超滤膜车间、纳滤膜车间等单体装饰工程施工；
- 2、钢结构、幕墙施工；
- 3、电动单梁悬挂起重机、电动葫芦、风机、蝶阀、吸泥机、穿孔指形槽、中心传动污泥浓缩机、膜架等安装；
- 4、沉淀池栏杆安装、折板施工；
- 5、平衡池、浓缩池栏杆安装；
- 6、室外电缆沟、加药管沟浇筑；
- 7、厂区生产管线、雨水管敷设；

二、第三污水处理厂扩建及一期提标改造

- 1、生化池壁板混凝土浇筑；
- 2、巴氏计量槽土方开挖、垫层浇筑。

三、塘桥片区污水处理厂扩建及一期提标改造

- 1、二沉池楼梯施工；
- 2、生化池壁板混凝土浇筑及隔墙施工；
- 3、污泥浓缩池土方开挖、垫层浇筑。
